

& green
project


Vi skaber tryghed i dit projekt

Program

- Besøg på varmeværket hos Hornsyld klimavarme
- Status på tilmeldinger
- Endeligt tilbud og entreprisekontrakt
- Revideret tidsplan
 - Projektforslag
 - Ansøgning til fjernvarmepuljen
- Kontaktpersoner

Status

Udgangspunkt	Forbrugere	Areal
Samlet behov	165	34.829 m2
Forventning	124	26.174 m2
Opbakning - antal	83	20.570 m2
Opbakning - %	65%	79%

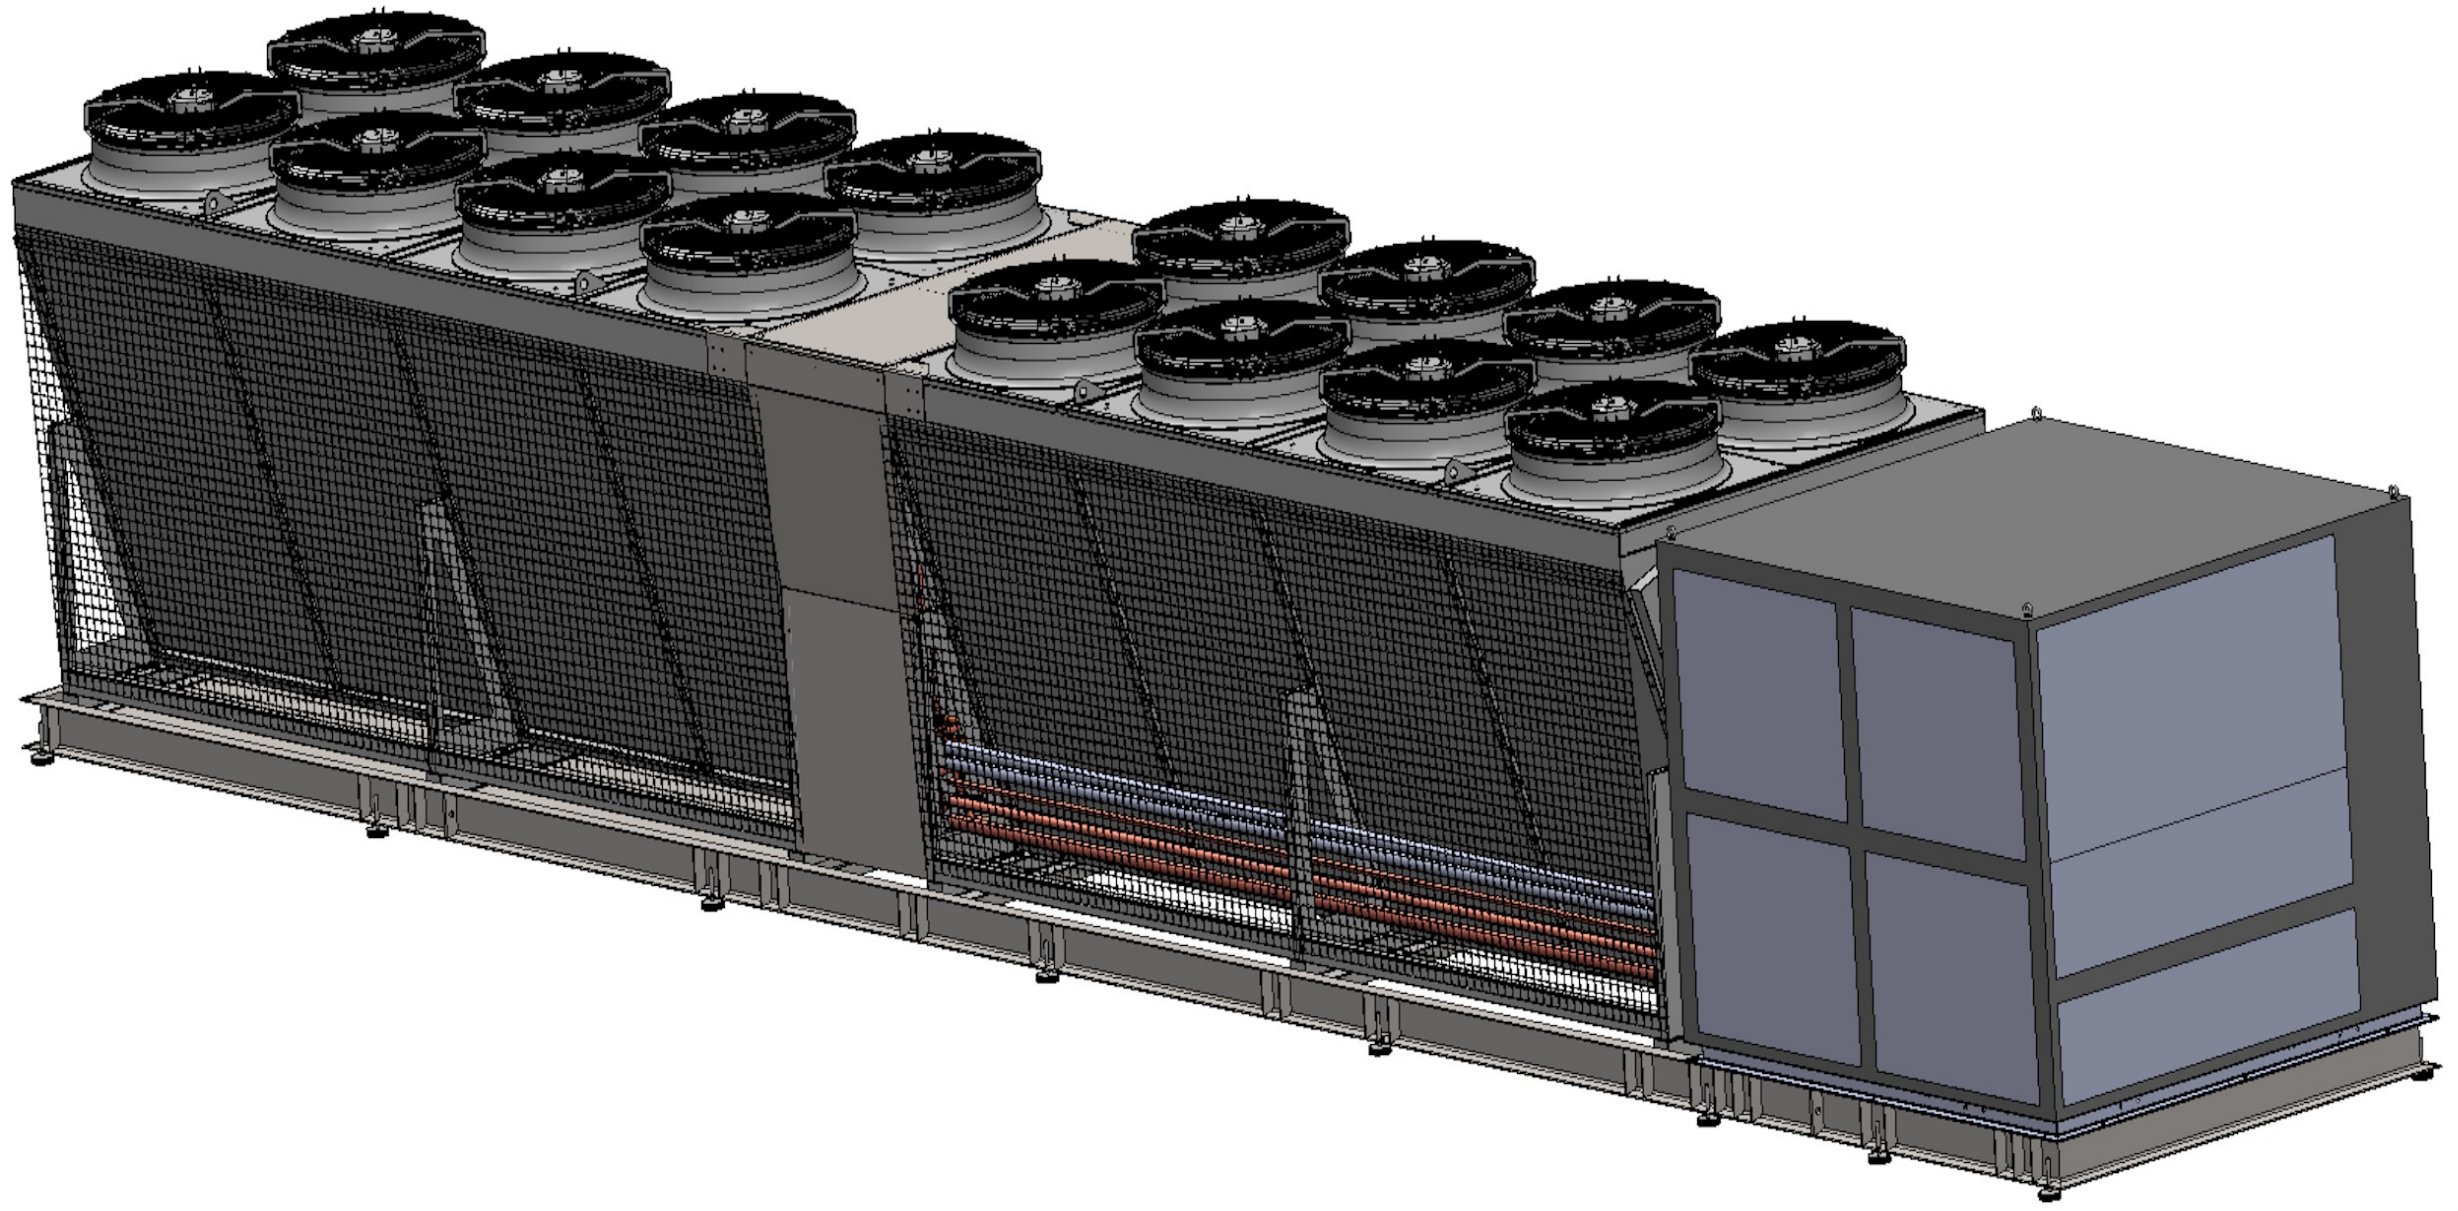

Tidsplan

- Borgermøde
- Bindende tilmelding
- Ansøgning til varmepumpepuljen
- Svar fra varmepumpepuljen
- Indsendelse af projektforslag
- Betinget godkendelse
- Ansøgning til fjernvarmepuljen
- Myndighedsbehandling færdig
2023
- Kommunegaranti
- 1. spadestik
- Forventet varmelevering påbegyndes
- Arbejdet afsluttet

20.09.2022

30.09.2022

31.10.2022

30.11.2022

02.01.2023

midt januar 2023/ **23.03.2023**

midt januar 2023/ **04.04.23**

midt marts 2023 / **midt juni**

slut marts 2023

april 2023 / **1. juli 2023**

jan 2024

slut 2024

Kontakt

Bestyrelsen

- Lars Søgaard, larssoegaard@gmail.com
- Jesper Brix, jesperbrix1@gmail.com
- Ove Bonde Møller, om@kjls.dk
- Ole Wind, ow@kjls.dk
- Kristian Frandsen, jensenfrandsenkristian@msn.com
- **& green project**
- Stig Caspersen, sc@andgreenproject.dk – 6016 8185
- Verner Rosendal, vr@andgreenproject.dk – 4016 2309
